



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI STRADE EXTRAURBANE

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data

DICEMBRE 2017

Scala

-

Allegato

1.0

Il progettista

Ing. Andrea Murgia

Il R.U.P.

Arch. Jr. Pierino Porru

Il Sindaco

Roberto Soddu

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di GENONI
Provincia di SUD SARDEGNA

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE EXTRAURBANE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENONI


CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

GENONI, li DICEMBRE 2017

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

ID	Nome	Durata 50,00 g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	01 - DEMOLIZIONI E SCAVI																										
2	D.0001.0002.0003 - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di	8,00																									
3	D.0001.0001.0006 - DEMOLIZIONE TOTALE E	8,00																									
4	D.0001.0001.0022 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A	4,00																									
5	D.0001.0002.0058 - TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti	4,00																									
6	D.0001.0002.0006 - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI	7,00																									
7	02 - PAVIMENTAZIONI																										
8	D.0001.0003.0003 - STRATO DI FONDAZIONE della	5,00																									
9	D.0001.0003.0026 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER	9,00																									
10	D.0001.0003.0016 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER	9,00																									

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

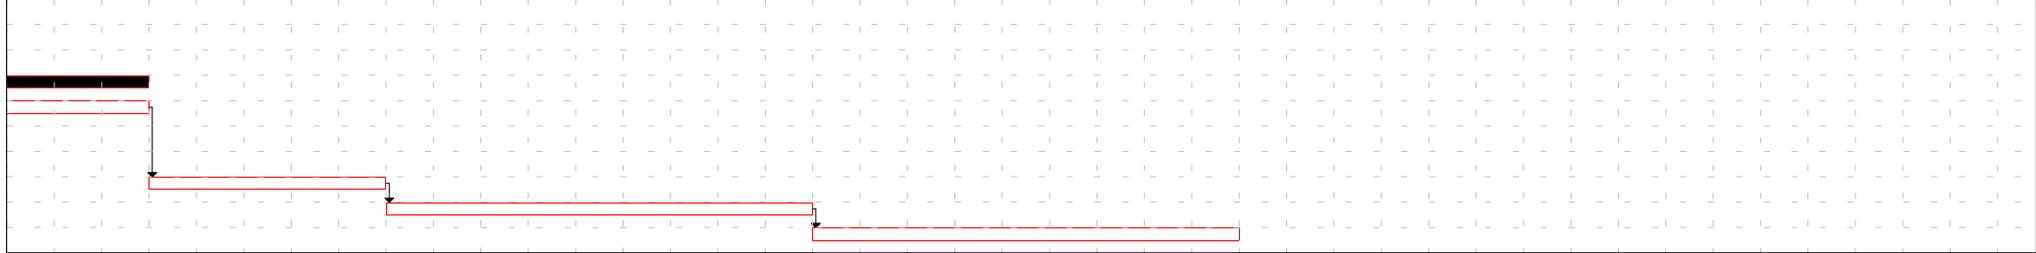

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di GENONI
Provincia di SUD SARDEGNA

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE EXTRAURBANE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENONI

PROGRAMMA DEI LAVORI

GENONI, li DICEMBRE 2017

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 1 a 27	da 28 a 37	da 38 a 46	da 47 a 50		
01 - DEMOLIZIONI E SCAVI	€ 12.328,80	€ 12.328,80					
D.0001.0002.0003 - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua...120 kg /cmq, eseguito senza uso di mine.	(€ 4.310,40)	(€ 4.310,40)					
D.0001.0001.0006 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI P...vimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO	(€ 2.235,01)	(€ 2.235,01)					
D.0001.0001.0022 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	(€ 2.917,37)	(€ 2.917,37)					
D.0001.0002.0058 - TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	(€ 1.386,02)	(€ 1.386,02)					
D.0001.0002.0006 - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...e con materiali provenienti dagli scavi	(€ 1.480,00)	(€ 1.480,00)					
02 - PAVIMENTAZIONI	€ 34.686,43		€ 12.063,80	€ 13.547,25	€ 9.075,38		
D.0001.0003.0003 - STRATO DI FONDAZIONE della massicciata... a spessore finito dopo il costipamento	(€ 9.310,03)		(€ 9.310,03)				
D.0001.0003.0026 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...a del fondo in strato da cm 3 compreso	(€ 4.956,79)		(€ 2.753,77)	(€ 2.203,02)			
D.0001.0003.0016 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO...presso per strade urbane e extraurbane.	(€ 20.419,61)			(€ 11.344,23)	(€ 9.075,38)		
IMPORTO		€ 12.328,80	€ 12.063,80	€ 13.547,25	€ 9.075,38		
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 12.328,80	€ 24.392,60	€ 37.939,85	€ 47.015,23		
%		26,22%	25,66%	28,81%	19,30%		
% PROGRESSIVA		26,22%	51,88%	80,70%	100,00%		

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di GENONI
Provincia di SUD SARDEGNA

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE EXTRAURBANE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENONI

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

GENONI, li DICEMBRE 2017

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
	27	27	€ 12.328,80	€ 12.328,80	26,22%	Si
	37	10	€ 24.392,60	€ 12.063,80	51,88%	Si
	46	9	€ 37.939,85	€ 13.547,25	80,70%	Si
	50	4	€ 47.015,23	€ 9.075,38	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 50 (cinquanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di GENONI
Provincia di SUD SARDEGNA


OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE EXTRAURBANE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENONI

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

GENONI, li DICEMBRE 2017

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

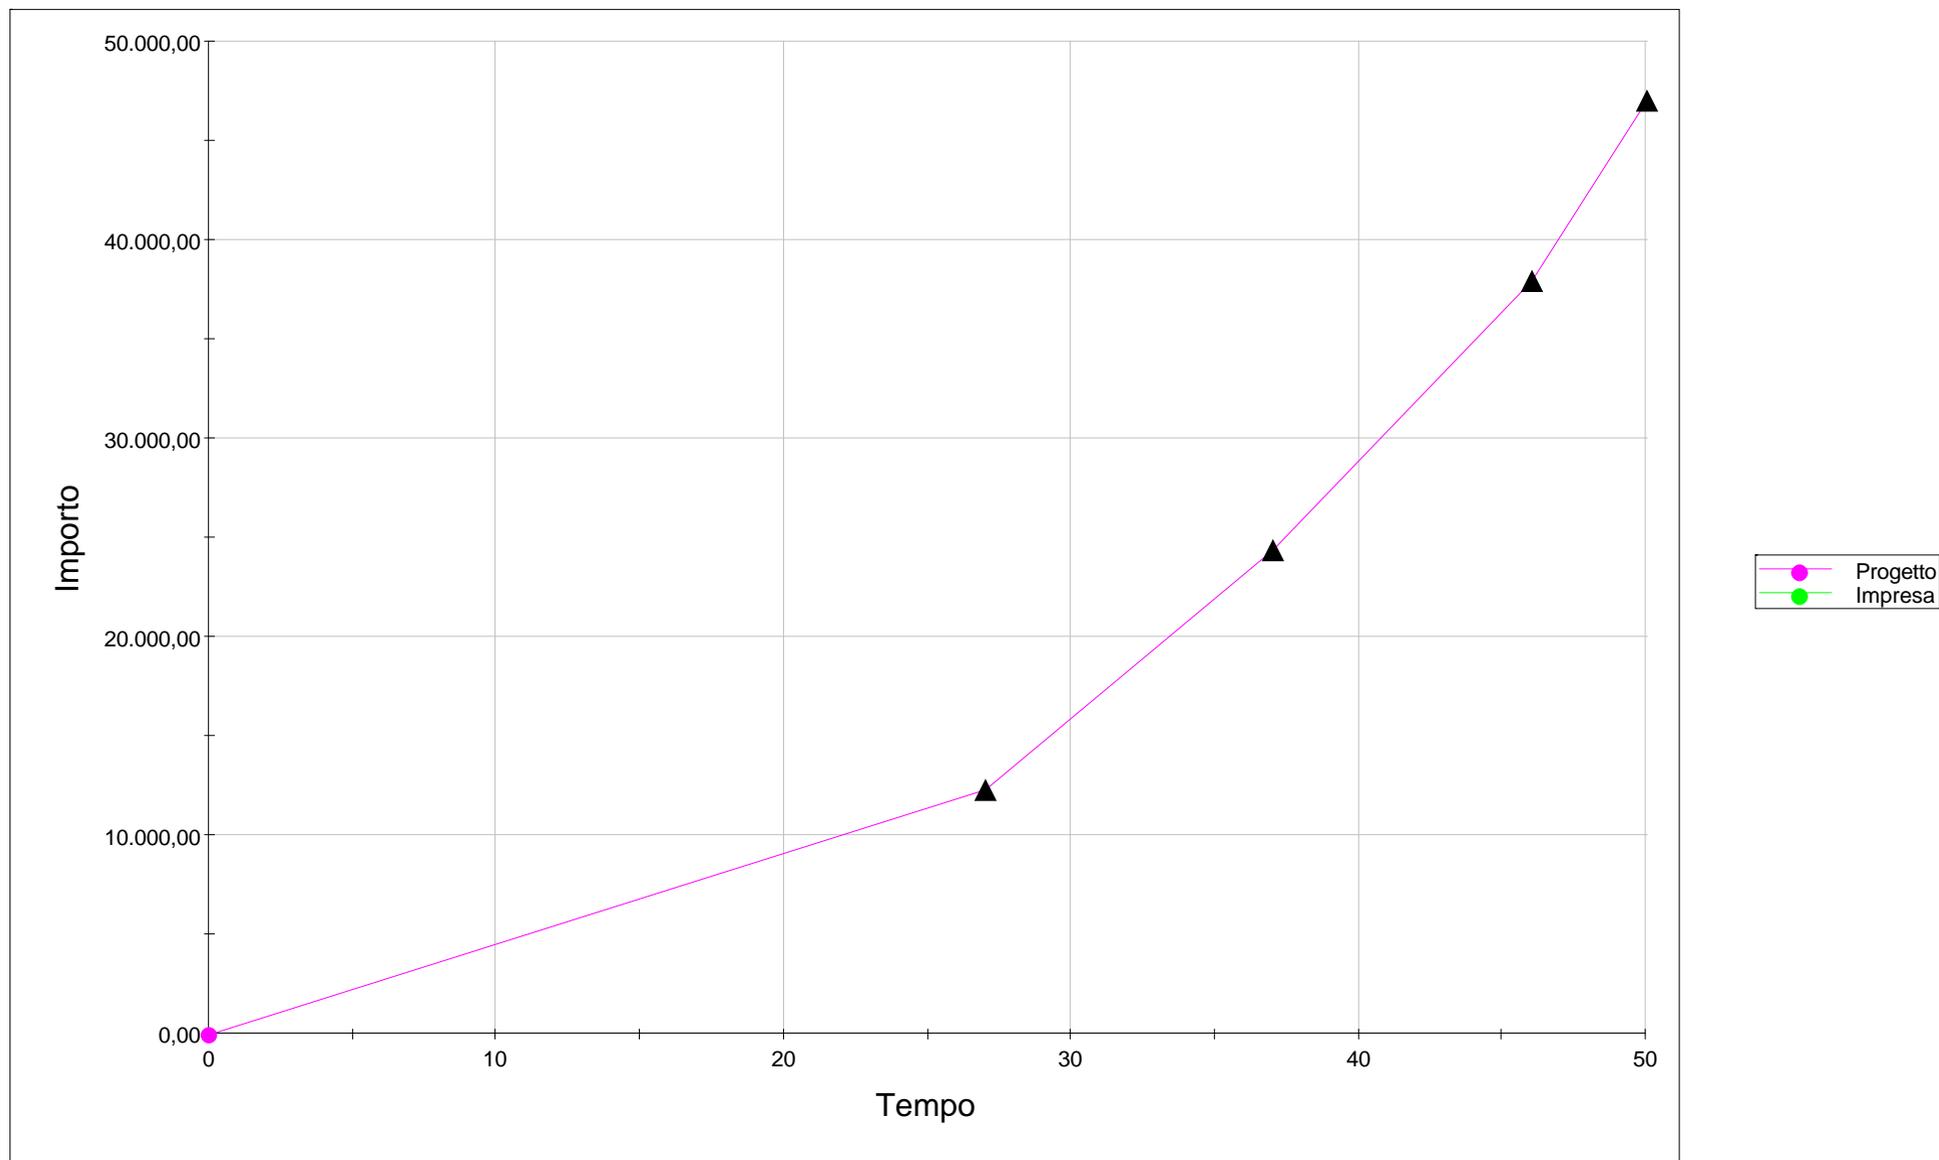

LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
